



FORMULARIO DE PROYECTO PROYECTO REFERENCIAL

TIPOLOGIA

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
(REP)

2021

División Gestión Territorial





FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CERTIFICADO POSTULACION DE PROYECTO FNSP 2021

Con fecha, **miércoles 31 de marzo del 2021**, a las **11:40 horas**, su proyecto ha sido exitosamente postulado al concurso Fondo Nacional de Seguridad Pública año 2021

Código del Proyecto : FNSP21-REP-0005
Institución Postulante : Municipalidad
Comuna :
Región :
Nombre del Proyecto : Recuperación de Espacios Públicos II
Monto Solicitado al FNSP : \$ 40.000.000.-

En este acto, su proyecto entrará a la etapa revisión de admisibilidad, según consta en la Bases del Concurso FNSP 2021, página web www.fnsp.cl



Formulario de Postulación

Identificación

Código Proyecto: FNSP21-REP-0005 Fecha de Postulación: 31-03-2021 11:40

Antecedentes Generales del Proyecto

Nombre del Proyecto	Recuperación de Espacios Públicos II
Área temática	Situacional
Tipología del proyecto	Recuperación de Espacios Públicos

Antecedentes de la Entidad Postulante

Nombre Entidad Postulante	Municipalidad
Tipo Entidad Postulante	Municipalidad
RUT Entidad	
Dirección	
Región	
Comuna	
Teléfono Fijo	1234567
Correo Electrónico	Municipalidad@gmail.com
Nombre Responsable	Municipalidad@gmail.com

Antecedentes del Responsable o Encargado del Proyecto

Nombre Responsable	Municipalidad
Correo Electrónico	Municipalidad@gmail.com
Teléfono Fijo	1234567
Teléfono Móvil	1234567

Problema a Intervenir

Diagnóstico

Respecto al comportamiento mensual debemos indicar que los casos policiales durante el año 2016, estuvieron en 6 meses sobre la línea de tendencia del año 2015. Los meses con una frecuencia mayor a la del año anterior son los meses de Enero, Marzo y Septiembre que coincide con la mayor concentración de población en la comuna por sus atributos turísticos, siendo el hurto y el robo los delitos más preponderantes. En el periodo 2015-2016, las principales incivildades corresponden a daños, que aumento respecto al año anterior; disminuyendo los casos amenazas, ebriedad y consumo de alcohol y otras incivildades, cabe señalar que las cifras son bajas respecto a la media regional en igual periodo de tiempo. Las incivildades, comprendidas como múltiples acciones que no se encuentran tipificadas como delitos, pero que por su frecuencia son uno de los elementos centrales en la percepción de temor y preocupación de la población. Según los datos entregados por la Subsecretaria de Prevención del Delito, para la comuna, podemos observar la totalidad de los casos registrados según el estado de prevalencia está dado por el siguiente orden: Incivildades: representa un 39% - Violencia Intrafamiliar: representa un 12%. - Hurtos: representa un 5% - Lesiones leves: representa un 5% - Robo en lugar no habitado: representa un 3%. La comuna de XXX presenta un problema de seguridad Pública orientado hacia las Incivildades (Ebriedad), la violencia Intrafamiliar y a delitos que afectan a la propiedad, como lo son el Hurto y el Robo en lugar no habitado (ambos relacionados con el comercio). De los 12 delitos de mayor connotación social; el delito de hurto es el que presenta una mayor variación al aumento, variando en un 13.3%, al igual que las lesiones leves que crecieron en un 66.7% y las violaciones crecen un 100%. Por el contrario el delito de Robo en lugar no habitado – que mantiene alta frecuencia- presentó una disminución de -50%. Por ultimo las incivildades que son las categorías con mayor número de casos policiales presentan una tasa inferior a la tasa regional y provincial, mientras que delitos como abusos sexuales, Violencia intrafamiliar y abigeato presentan tasas superiores a la regional y provincial. (Fuente: subsecretaria de prevención del delito) El diagnostico ha permitido determinar que las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas son aquellas prácticas que tienen lugar en el espacio público, manifestaciones de violencia como las amenazas, las agresiones verbales y físicas, presencia de grupos consumiendo alcohol u otras sustancias en la vía pública, la presencia de micro basurales en ciertos puntos, accidentes de tránsito producto de la falta de señalética vial y la falta de iluminación en sectores de alta concurrencia.

Problema a intervenir

El presente proyecto pretende contribuir de forma significativa a la prevención y disminución de los delitos de mayor connotación social, desordenes y conductas que aumentan la sensación de inseguridad y ponen en riesgo a los vecinos y transeúntes que viven y transitan en el sector de la Villa. Existen sectores de la comuna, que por las características sociales y económicas son más proclives a sufrir delitos asociados al robo en lugar habitado, robo con fuerza a la vivienda, hurto, entre otros. Además de los problemas mencionados anteriormente se suman factores de riesgo como lugares inseguros, con poca iluminación y un mal uso de espacio público, lo que aumenta las probabilidades de que se generen situaciones como consumo de alcohol en espacios públicos, tráfico y microtráfico de drogas, daños en la propiedad pública y privada asociados a estas conductas, definidas como incivildades, las cuales son las mayormente denunciadas por los distintos barrios de la comuna. además se señala que en lo que respecta a controles por consumo de alcohol y drogas estos se establecen con mayor frecuencia en sitios eriazos, lugares en notable estado de abandono y sin vigilancia natural con áreas totalmente oscuras a falta de iluminación de los sectores y escasa participación comunitaria que permita utilizar estos espacios para actividades de fortalecimiento vecinal, organizacional y social, que permitan mayor cohesión social como una forma de seguridad de la población frente a la percepción de seguridad. Precisamente son las incivildades, definidas como delitos o faltas que ocurren principalmente en el espacio público, que son visibles (quienes las cometen no se ocultan) y que afectan negativamente el uso del espacio público por parte de la ciudadanía, generando percepciones de temor e inseguridad. Aunque muchas veces no constituyan delitos, las incivildades son un tema relevante en materia de seguridad pública. Las incivildades que presentan mayor número de casos es la ebriedad, la cual representa un 13.4% del total de casos policiales en la Comuna de X y el 34% del total de incivildades.

Justificación

Contribuir en la planificación y construcción de ciudades más seguras y en armonía con su entorno para todos los habitantes, es uno de los grandes desafíos de la Municipalidad, inmerso en uno de los ejes estratégicos de la presente administración y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N°. 20.965 es una comuna con apenas 36 años de vida institucional, que ha sabido conducir el desarrollo económico y social en virtud de sus atributos, potencialidades y cultura, para generar condiciones que permitan mayores y mejores oportunidades para todas las familias, resguardando en ello algo tan importante como es la seguridad, en torno a mejorar la percepción y el trabajo comunitario como una herramienta de prevención de delitos, a través de campañas apoyadas por las policías y fiscalía en torno a fortalecer las denuncias ciudadanas de los

distintos tipos de delitos a través de plataformas institucionales, como el fono denuncia seguro y una mayor cercanía con carabineros a través de un trabajo con organizaciones sociales, en las cuales ellas puedan dirigir sus principales inquietudes y problemáticas de seguridad. El presente proyecto intenta dar respuesta a las inquietudes que los vecinos de esta comuna, han presentado en reiteradas ocasiones a los distintos departamentos de la Municipalidad y que dicen relación con la recuperación de espacios públicos que por años han estado abandonados siendo focos de encuentro de jóvenes para el consumo de alcohol y drogas generando en la población inseguridad respecto de su integridad física y la seguridad de sus moradas. Esta Villa nunca ha obtenido un proyecto de inversión que tenga relación con la creación o recuperación de espacios públicos, para así prevenir y disminuir factores de riesgo, por cuanto existe un ambiente de frustración en muchas familias del lugar, quienes observan como los niños y jóvenes no pueden acceder a actividades recreativas en lugares apropiados, lo que aumenta la inseguridad de las familias ya que se fomenta el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas, creando situaciones muchas veces violentas y molestas para todos quienes viven ahí. Motivo por el cual las familias necesitan contar con espacios que fortalezcan la buena convivencia y vecindad, mejoren las condiciones sociales y recreativas de niños y jóvenes, evitando así conductas o situaciones transgresoras, en toda época del año, en el cual se desarrollen actividades sociales, artísticas y tradicionales con énfasis en la participación y que agrupen a toda la familia como mecanismo de prevención. Al ser un proyecto de prevención situacional la intervención se realizará de manera indirecta sobre los beneficiarios, por cuanto se deberá realizar un proceso paralelo a la modificación de los espacios públicos, proceso de inducción hacia la internalización de conceptos y elementos que les permitan contar con las herramientas necesarias para actuar en determinadas situaciones a las cuales se vean enfrentados y en donde se vean vulnerados de una u otra forma alguno de sus derechos, herramientas que vienen a reforzar los factores protectores de violencia o delincuencia que de manera inherente posee cada uno de los individuos integrantes de esta sociedad. Al contar con estas herramientas, dejarán de ser entes pasivos para convertirse en protagonistas de la búsqueda de diferentes alternativas de solución de una problemática, disminuyendo de esta forma el grado de vulnerabilidad de nuestros vecinos. Con lo anterior también disminuirémos la victimización por cuanto la solución de su problema no pasa por la intervención constante de un tercero, sino que por su propio actuar, por cuanto no tan solo se entregarán las herramientas sino que además se modificará un lugar que por años ha sido causante de inseguridad y vulnerabilidad de quienes tenían acceso a él. Es así que este proyecto intenta disminuir la percepción del temor recuperando espacios en estado de abandono para el fortalecimiento de la vida social, familiar y, organizacional. Para ello se trabajara en un enfoque cualitativo y cuantitativo, que permita no solo el análisis de datos sino que una comprensión más profunda en el área social del problema de seguridad, con un diagnóstico del análisis territorial, abarcando la mayor cantidad de sectores de la villa de manera de lograr una importante cobertura territorial.

Objetivos y Coberturas

Objetivo General	
Contribuir a la disminución de factores de riesgo, percepción de temor e inseguridad mediante la consolidación de un espacio público, mejorando condiciones de uso, accesibilidad y permanencia.	
Objetivos Específicos	
1. Planificar y organizar un trabajo coordinado con los actores locales y vecinos presentes en el territorio. 2. Llevar a cabo las acciones que permitan la materialización de la obra propuesta en el territorio focalizado. 3. Realizar talleres con los actores locales y vecinos promoviendo el buen uso y mantención de la intervención.	
Focalización Territorial	
Región	
Comuna	
Sector, Población, Barrio, Villa	Villa Comunal
Describe el territorio focalizado a intervenir	La Villa, pertenecen a la Junta de Vecinos B, el cual posee una superficie de 21.000 mt ² , con 200 viviendas y cantidad de 600 habitantes En el sector de la Villa encontramos 220 familias, que corresponden a 150 jefaturas féminas y 70 jefaturas masculinas, según datos suministrados por ficha de protección social, los porcentajes de vulnerabilidad según el quintil, indica que un 53% corresponde al primer quintil, un 31% al segundo quintil y 16% al tercer quintil. La situación social del sector se destaca por su alta vulnerabilidad social, cabe destacar que el 60% de los jefes de hogar de estos grupos familiares los ingresos económicos provienen directamente de trabajos esporádicos que realizan en diferentes áreas y de sus pensiones o jubilaciones que solo alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. La población de la comuna es de 5.628 habitantes, de los cuales un 41,5% corresponde al sector urbano y un 58,5% corresponde al sector rural, según el último Censo oficial disponible (año 2002) establecidos por el instituto nacional de estadísticas (INE). El entorno socio-productivo de la comuna se encuentra escasamente diversificado, concentrado en unos pocas actividades económicas, siendo las principales actividades: el comercio al por mayor y menor, la agricultura, ganadería, caza, y silvicultura, que dada la situación de tenencia de la tierra está basado fundamentalmente en la pequeñas propiedad campesina y mapuche; la irrupción de un incipiente rubro de restaurantes y hoteles, el que si bien ha duplicado su presencia aún sigue siendo exiguo; industrias manufactureras no metálicas. La comuna cuenta con un centro de salud familiar, un liceo y colegio municipal, en el sector urbano, 2 colegios particulares subvencionados, un cajero automático, y servicios de restaurantes, hospedajes, centros turísticos y comercio en general. así mismo una diversidad de locales (Botillerías, bazar, zapaterías, librerías, multitiendas, entre otras), según datos de oficinas de rentas y patentes Municipal, se encuentran 80 patentes comerciales, de las cuales un 72% corresponde al sector Céntrico de la ciudad.
Población Objetivo	
Nº de Beneficiarios Directos (personas)	400
Descripción de características de los beneficiarios directos	
En el sector de la Villa, encontramos 220 familias, que corresponden a 150 jefaturas féminas y 70 jefaturas masculinas, según datos suministrados por ficha de protección social, los porcentajes de vulnerabilidad según el quintil, indica que un 53% corresponde al primer quintil, un 31% al segundo quintil y 16% al tercer quintil. La situación social del sector se destaca por su alta vulnerabilidad social, cabe destacar que el 60% de los jefes de hogar de estos grupos familiares los ingresos económicos provienen directamente de trabajos esporádicos que realizan en diferentes áreas y de sus pensiones o jubilaciones que solo alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Cabe señalar que esta población se encuentra viviendo en la zona de mayor flujo comercial y de servicios, no obstante los propietarios de locales comerciales, habitan en zonas periféricas, por cuanto no existe una conexión de cercanía con locales comerciales, en cuanto a poder llegar en poco tiempo, en los casos de delitos. Por esta razón este grupo objetivo, que participa de las unidades vecinales de juntas de vecinos, ven como la inseguridad se apodera de sus sectores, impidiendo una calidad de vida acorde con el crecimiento y desarrollo de la comuna. Los principales delitos de robo y hurto, son provocados a metros de sus hogares, siendo parte del proceso delictual, perjudicando su vida familiar, aumentando el temor e inseguridad constantes, además de ver como el centro de encuentro de la comunidad en general, es	

invasión por delincuentes que al no tener control en vigilancia, realiza delitos de manera planificada y regular. Las principales demandas de este sector corresponden a temas de infraestructura vial debido a que esta es deficiente en el sector. Una mayor señalización en los accesos a lugares públicos como los colegios. Se aprecia en este sector un bajo nivel de arborización tanto de los espacios públicos como privados. Por datos suministrados por carabineros, las principales denuncias son por desorden, consumo de bebidas alcohólicas, destrucción de propiedad privada, en horarios nocturnos, en el que la vigilancia comunitaria no existe.

Cuadro de Infraestructura comprometida

Descripción de la infraestructura comprometida

Se contempla el mejoramiento de una plaza de 200 m², la que considera áreas verdes y jardinera, la instalación de nuevos juegos infantiles inclusivos y máquinas de ejercicios sobre pastelones de caucho, también la instalación de mobiliario urbano y basureros en las áreas de circulación sobre los pavimentos de maicillo compactado, y también contempla una ruta accesible en la cual se definen cambios de superficie con baldosa microvibrada podo táctil hacia la conectividad de la plazoleta. Para finalizar se considera la instalación de luminaria led de alta eficiencia para cubrir la demanda de luz en el sector.

Cuadro Infraestructura comprometida

Tipología	Item	Cantidad
REP	N° de Metros Cuadrados Recuperados o Construidos	200

Plan de Gestión

Mantenimiento del espacio público recuperado. 1.- Mantenimiento de áreas verdes, recolección de basura y Limpieza: la Municipalidad a través del aseo licitado, realizara la limpieza, mantención de áreas verdes y recolección de basura de la plazoleta. Este trabajo se realizara de manera semanal, por personal calificado en las labores de aseo y ornato, así como la recolección de ramas, hojas y maleza, producto de la mantención de las áreas verdes. De igual forma el retiro de residuos en contenedores o basureros. 2.- Sistema de iluminación: el sistema de iluminación será supervisado de manera mensual por personal de obras municipales, de manera de entregar un suministro oportuno, estable y continuo a los vecinos de la villa, este trabajo será realizado por personal municipal calificado, garantizando la reposición de materiales y repuestos deteriorados por el tiempo o por el uso.

Metología y Actividades

Descripción Metodológica

La metodología aplicada consistirá en un enfoque cualitativo y cuantitativo, que permita no solo el análisis de datos sino que una comprensión más profunda en el área social del problema de seguridad del sector que involucra y barrios adyacentes. El diagnóstico tendrá un énfasis territorial, abarcando la mayor cantidad de sectores que involucra los barrios, de manera de lograr una importante cobertura territorial. Para la obtención de información se realizarán las siguientes técnicas: Entrevista semi-estructurada: El diagnóstico contemplará la realización de entrevistas a distintos actores clave de la comuna (policías, funcionarios municipales, vecinos, dirigentes, miembros de la sociedad civil) Grupos focales: El diagnóstico contemplará la realización de encuestas/entrevistas focales dirigidos principalmente a juntas de vecinos y organizaciones de los distintos sectores de la comuna a través de reuniones sociales y comunitarias Trabajo con fuentes Cuantitativas: Permitirá una descripción objetiva de los fenómenos de la inseguridad y una caracterización socio delictiva de la comuna en base a los datos cuantitativos disponibles de diversas fuentes (estadísticas policiales, subsecretaría de prevención del delito, CASEN, ENUSC, Carabineros, entre otras) Matriz: Evaluación social Línea de Intervención 1: Invitar a la comunidad, organizaciones, instituciones y vecinos en general a participar en procesos para detectar situaciones atinentes a la seguridad Elaborar sistemas para toma de datos de la ciudadanía Sistematización de información Convocar a organizaciones, instituciones y Ciudadanía, a conocer principales resultados, mediante convocatoria en medios de comunicación locales Exposición de resultados a la ciudadanía y conocimiento de resultado de diagnóstico Matriz: Integración social Línea de Intervención 2: Programar jornadas de capacitación a la ciudadanía, comercio e instituciones Conformación de Red de apoyo, sus funciones, impacto y plan de trabajo Matriz: Articulación con instituciones y organizaciones comunales Línea de Intervención 3: Establecer mesas comunales para sentar las bases de la política comunal de prevención Difundir mesas comunales Detectar principales hitos para la política de seguridad comunal, según trabajo de red de apoyo y organizaciones

Equipo Ejecutor

Cargo	Perfil	Funciones Asociadas	Carga Horaria	Tipo Aporte	Remuneración	Meses de contrato
Contraparte Técnica y Administrativa	Área de las Ciencias Sociales, área de la Construcción, Administración y/o a fin.	Velar por el cumplimiento del proyecto en los ámbitos técnicos, administrativos y financieros, como así también coordinar las redes de apoyo institucional, municipal y de los vecinos.	0	Aporte Propio	\$ 0	0
Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Área de la Construcción y/o afín	Apoyar la implementación y cumplimiento del ámbito técnico y administrativo de la ejecución de las obras y/o prestación de servicios.	12	Aporte Propio	\$ 0	0
Profesional de apoyo para ámbito comunitario	Área de las Ciencias Sociales y/o afín	Apoyar la implementación y cumplimiento del ámbito comunitario y participativo del proyecto.	12	Aporte Propio	\$ 0	0

Líneas de Intervención, etapas y actividades

Línea de Intervención	Etapas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Inicio	Término
Inicial	Instalación	Instalación	Realización de trámites previos al inicio de la intervención como recepción de fondos, presentación de acta de inicio, validación y contratación del equipo ejecutor, entre otras.	Entidad Ejecutora	Mes 1	Mes 1
Intermedia	Inserción Comunitaria	Comienzo y/o lanzamiento cony	Se realizará la actividad reunión de inicio	Profesional de apoyo para el	Mes 2	Mes 2


		la comunidad	paralela a la ejecución de la obra. En esta actividad se dará a conocer los talleres a implementar y la planificación al respecto.	ámbito técnico		
Intermedia	Inserción Comunitaria	Diseño y validación de material de difusión	Se diseñarán las diferentes dependones, flyers, letrero de obra, lápices, bolsas y letrero de señalética, se diseñará y mandara a confeccionar oportunamente para disponer de ellos en talleres y demás actividades de ejecución de la obra, inauguración del proyecto, cierre del mismo.	Contraparte Técnica y Administrativa	Mes 3	Mes 4
Intermedia	Inserción Comunitaria	Reunión(es): Coordinación de redes	Se gestionaron y se gestionarán vínculos con organismos competentes que nos ayuden a desarrollar de mejor manera el proyecto y actividades con la comunidad desde el termino de la ejecución de la obra hasta el termino del proyecto.	Contraparte Técnica y Administrativa	Mes 3	Mes 5
Intermedia	Inserción Comunitaria	Reunión(es): Informativa del estado de ejecución	Se realizara una Reunión con todos los vecinos y vecinas de la Villa, además de personal de jardín infantil que colinda el área verde para dar a conocer el desarrollo de la ejecución de la obra que se estima para este momento que la contraparte estime estados de avances importantes a informa a los beneficiarios directos.	Contraparte Técnica y Administrativa	Mes 2	Mes 10
Intermedia	Inserción Comunitaria	Capacitación(es): Medidas de autocuidado y gestión urbana	Capacitación en medidas de Gestión Urbana, realizada para los beneficiarios directos del proyecto. Además se considera implementar estrategias	Profesional de Gestión apoyo para el ámbito técnico	Mes 5	Mes 8

			de mantención del área verde recuperada.			
Intermedia	Inserción Comunitaria	Capacitación(es): Comité de seguridad y plan de acción comunitario	Creación de un comité de seguridad con los beneficiarios directos que enfrentan la plaza, se realizará en conjunto con el encargado de seguridad de la municipalidad y otras coordinaciones de redes que se consideran como compromisos de su implementación.	Profesional de apoyo para el ámbito comunitario	Mes 3	Mes 5
Intermedia	Ejecución de Obras	Ajustes del Proyecto Técnico	Se revisará junto a al departamento municipal técnico encargado de realizar el proceso de licitación los ajustes técnicos en caso de ser necesario, según el escenario real al momento de iniciar su ejecución.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 2	Mes 3
Intermedia	Ejecución de Obras	Elaboración de bases	Profesional técnico iniciara el proceso de redacción de bases de licitación, según proyecto técnico presentado al concurso.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 3	Mes 4
Intermedia	Ejecución de Obras	Publicación de bases	Departamento técnico encargado de publicaciones licitaciones municipales iniciara el proceso de licitación en plataforma de mercado público.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 4	Mes 5
Intermedia	Ejecución de Obras	Adjudicación	Departamento técnico encargado de evaluar el cierre de licitación iniciara el proceso adjudicatorio. En caso de presentar oferentes se espera realizar nueva licitación.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 5	Mes 5
Intermedia	Ejecución de Obras	Firma de contrato	Departamento técnico encargado de realizar la contratación de la empresa adjudicada, procederá a finalizar tramites administrativos y técnicos con la empresa seleccionada para implementar el proyecto.	Contraparte Técnica y Administrativa	Mes 6	Mes 6
Intermedia	Ejecución de Obras	Entrega de	Profesional técnico	Profesional de	Mes 6	Mes 7

		terreno	municipal en conjunto con representante de la empresa inician formalmente el acto de entrega de terreno a la empresa para su ejecución. Se indica el plazo para instalación de letreo de obras,	apoyo para el ámbito técnico		
Intermedia	Ejecución de Obras	Ejecución de la obra	Proceso de ejecución de las obras físicas, las cuales serán supervisadas por profesional del departamento de Obras municipales encargado (ITO).	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 7	Mes 9
Intermedia	Ejecución de Obras	Recepción Provisoria de la obra	Finalizado la correcta construcción de las obras, se procede a realizar el acto de recepción provisoria del proyecto, considerando las fechas estipuladas en el contrato.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 9	Mes 10
Final	Cierre de proyecto	Inauguración del proyecto	Se realizará una actividad de inauguración del espacio público, junto con la comunidad y los organismos que participaron en la realización y mejoramiento.	Contraparte Técnica y Administrativa	Mes 10	Mes 11

Carta Gantt y Ejecución del proyecto

Ejecución proyecto: 11 meses

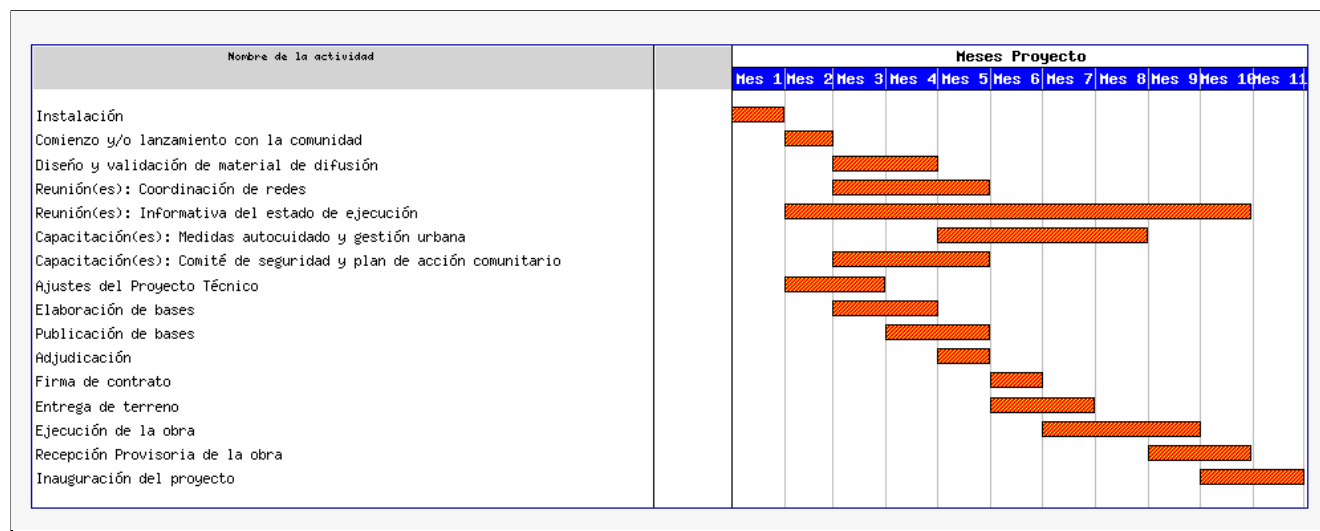

Coordinación en redes

Institución	Ámbitos de coordinación	Contacto responsable
Carabineros de Chile	Capacitación medidas gestión urbana comprometidas en la matriz de actividades del proyecto	Teniente Comunal
Depto Seguridad Pública	Apoyo constante en actividades comunitarias del proyecto en ámbitos de seguridad	Encargado de seguridad
Junta de Vecinos	Proporcionar apoyo en el trabajo comunitario, tanto en ámbitos de difusión como de instalaciones.	Presidente Junta de Vecinos II

Resultados Esperados

Resultado Esperado	Indicador	Meta	Verificador
Plan de trabajo de proyectos, tipologías de prevención situacional	Plan de trabajo de proyectos de prevención situacional	100 %	-Plan de trabajo de proyectos de prevención situacional y cronograma asociado -Registros de asistencia -Registro
Aumento de la percepción de seguridad de la población beneficiaria del proyecto	Porcentaje de vecinos que aumenta la sensación de seguridad en el territorio cubierto por el proyecto	80 %	-Encuesta de percepción de inseguridad
El proyecto provee prestaciones de calidad	Porcentaje de beneficiarios/as que evalúan positivamente el proyecto	70 %	-Encuestas de satisfacción de usuarios/as -Informe de calidad del proyecto

Presupuesto

Itemizado Presupuestario

Ítem Presupuestario	Descripción	Aporte Solicitado	Aporte Propio	Aporte Terceros
Infraestructura	Mejoramiento área verde; mobiliario urbano, iluminación, pavimentos, juegos infantiles y vegetación (itemizado proyecto técnico)	\$ 38.500.000	\$ 0	\$ 0
Difusión y Publicidad	Pendones, pasacalles, folletería según cotización	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0
Servicios de producción y desarrollo de eventos	Acto de inauguración; servicio de banquetearía según cotización	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0

Resumen Presupuestario

Ítem Presupuestario	% FNSP	Aporte Solicitado	Aporte Propio	Aporte Terceros	Total
Infraestructura	96 %	38.500.000	0	0	38.500.000
Difusión y Publicidad	3 %	1.000.000	0	0	1.000.000
Servicios de producción y desarrollo de eventos	1 %	500.000	0	0	500.000
Total	100 %	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000.000

Justificación presupuestaria






1. ítem infraestructura corresponde a Proyecto técnico según itemizado presupuesto elaborado por el municipio. 2. ítem Difusión y publicidad; corresponde a insumos para llevar a cabo la actividad de difusión presentada en el cronograma de actividades del proyecto. Se adjunta cotización respaldando el valor de los elementos presentados. 3. ítem servicios de producción y eventos; corresponde al acto de cierre del proyecto, vinculado a la actividad de cierre presentado en cronograma de actividades, se adjunta cotización de banquetearía del servicio para el acto.












Resumen

Resumen descriptivo del proyecto

El Proyecto Recuperación de plazoleta para el fortalecimiento comunitario y la inclusión, se encuentra localizado en un área de influencia de gran número de viviendas y barrios residenciales agrupados en villas y poblaciones. Este Proyecto pretende ser un elemento que cohesione y agrupe a la comunidad en torno a un objetivo común, donde si bien se considera el trabajo de las policías, esta función trasciende a fortalecer los lazos y comunicación social con las organizaciones e instituciones sociales, quienes observan un trabajo integrador precisamente en barrios “familiares” como también en unidades vecinales, disminuyendo las oportunidades para la comisión de delitos, actos de violencia, prevención del delito del delito y fortalecer la disminución de incivildades que producen un grave daño a la tranquilidad de las familias, en especial de niños quienes observan que los espacios comunitarios son utilizados por grupos infractores de ley, quienes provocan daños y desordenes asociados al consumo de alcohol y drogas, con la recuperación de la plazoleta las familias podrán contar con un espacio seguro y comunitario para todos sus habitantes.

Anexos

Anexos del Proyecto	
Declaración jurada de no estar sujeta a Inhabilidades (NOTARIAL)	
Declaración jurada de "Aportes Propios" (Cuando corresponda)	
Declaración jurada de "Aportes de Terceros" (Cuando corresponda)	
Documento que dé cuenta de la existencia de un derecho de la Entidad postulante a intervenir el espacio propuesto.	
Carta de Compromiso Municipal	

Anexos requeridos		
Documento	Formato Archivo	Tipología REP
Certificados y Cartas de compromiso		
1-Plano de ubicación y emplazamiento del área a intervenir	AUTOCAD	
2-Plano de Situación Existente: planta, simbología, cortes, perfiles de calles, entre otros.	AUTOCAD	
3-Plano de Situación Propuesta: planta, simbología, cortes, perfiles de calles, entre otros.	AUTOCAD	
4-Planos firmados o viñetas firmadas	PDF	
5-Especificaciones Técnicas	PDF	
6-Presupuesto itemizado	PDF	
Proyecto Técnico		
1-Carta Compromiso de Mantención	PDF	
2-Plan de Mantención	PDF	
3-* Certificado de Factibilidad eléctrica y/o agua potable(cuando corresponda)	PDF	
4-* Certificado de No Factibilidad Eléctrica (aplica para instalación de iluminación solar)	PDF	
5-* Certificado de Cumplimiento Lumínico (cuando corresponda)	PDF	
6-* Certificado de Cumplimiento Accesibilidad Universal (cuando corresponda)	PDF	

Otros Anexos	
FORMULARIO-REP_2019.pdf	
