



FORMULARIO DE PROYECTO PROYECTO REFERENCIAL

TIPOLOGIA

INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN
SITUACIONAL (IPSI)

2021

División Gestión Territorial





FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CERTIFICADO POSTULACION DE PROYECTO FNSP 2021

Con fecha, **miércoles 31 de marzo del 2021**, a las **13:06 horas**, su proyecto ha sido exitosamente postulado al concurso Fondo Nacional de Seguridad Pública año 2021

Código del Proyecto : FNSP21-IPSI-0007
Institución Postulante : Municipalidad
Comuna :
Región :
Nombre del Proyecto : Innovación en Prevención Situacional II
Monto Solicitado al FNSP : \$ 38.700.000.-

En este acto, su proyecto entrará a la etapa revisión de admisibilidad, según consta en la Bases del Concurso FNSP 2021, página web www.fnsp.cl



Formulario de Postulación

Identificación

Código Proyecto: FNSP21-IPSI-0007 Fecha de Postulación: 31-03-2021 13:06

Antecedentes Generales del Proyecto

Nombre del Proyecto	Innovación en Prevención Situacional II
Área temática	Situacional
Tipología del proyecto	Innovación en Prevención Situacional

Antecedentes de la Entidad Postulante

Nombre Entidad Postulante	municipalidad
Tipo Entidad Postulante	Municipalidad
RUT Entidad	
Dirección	
Región	
Comuna	
Teléfono Fijo	1234567
Correo Electrónico	municipalidad@gmail.com
Nombre Responsable	municipalidad@gmail.com

Antecedentes del Responsable o Encargado del Proyecto

Nombre Responsable	MUNICIPALIDAD
Correo Electrónico	municipalidad@gmail.com
Teléfono Fijo	1234567
Teléfono Móvil	1234567

Problema a Intervenir

Diagnóstico

La comuna se caracteriza por poseer una cultura rural campesina, sumado a su alta dispersión territorial producto de las distancias en las que se encuentra cada una de sus localidades; razón por la cual, la conectividad entre los asentamientos humanos más apartados de la comuna es extremadamente deficiente o casi nula, cuyos accesos a las entidades de resguardo público se hace aún más difícil cuando los caminos se encuentran cortados ya sea por factores climáticos o de arreglos continuos y permanentes que se les debe hacer para que los vecinos puedan entrar a sus respectivas residencias o propiedades privadas. Dado a lo anterior, la unión de juntas de vecinos, entidad de carácter comunitaria a través de sus reuniones mensuales ha manifestado de forma constante la necesidad de poder contar con diversas estrategias de guardo, protección o prevención delictual, todo ello con la finalidad de poder brindar un mayor mecanismo de seguridad a cada uno de los vecinos y vecinas de la comuna. Sumado a lo anterior, desde la perspectiva de los vecinos y vecinas, la delincuencia está muy asociada a la carencia de fuentes laborales, inestabilidad del mercado laboral, déficit en la iluminación pública y sobre todo en los sectores rurales donde no existe iluminación en las respectivas vías, llegada de nuevos residentes “Personas desconocidas”, la gran cantidad de negocios de bebidas alcohólicas, deserción escolar, falta de espacios de recreación juvenil, ventas clandestinas de alcohol, consumo de drogas duras, siendo el delito de mayor frecuencia la matanza de animales para la venta ilegal, más conocido como Abigeato. En la comuna, durante el año 2019, el Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros de Chile (STOP), registró un total de 11.946 Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), un 5% menos que el año 2018. No obstante, esta baja global de delitos, el subgrupo de Delitos Violentos experimentó un incremento en el caso del Robo con Intimidación (RCI) y Robo con Violencia (RCV), de 2% y 3% respectivamente, y de un 13%, en el caso del Robo en Lugar No Habitado (RLNH). En RCI y RCV el incremento se ha producido, principalmente, en la vía pública, teniendo por víctimas transeúntes y vecinos que circulan por las calles. Al marginar del análisis el delito de hurto, propio de zonas comerciales de alto tránsito y de complejo tratamiento por su baja penalidad; se observa que la distribución de los demás DMCS abarca la totalidad de la comuna con distintas intensidades, concentrándose principalmente en los sectores comerciales del eje Providencia y en el sector poniente de la comuna. Razón por la cual, los principales esfuerzos en materia de teleprotección, coinciden con dichas concentraciones. Durante el primer trimestre del 2020, los datos de Carabineros de Chile registran una disminución del 1% en los DMCS respecto al mismo periodo del año anterior, apalancada por la reducción de registro de los delitos de Hurto y Robo en Lugar Habitado (RLH), con un 28% y un 31% menos respectivamente. En el caso del hurto, podría asociarse su disminución al efecto negativo del estallido social en el comercio y de la cuarentena por COVID-19. Ambos fenómenos han reducido la circulación de personas y con ello el tránsito de población flotante y comercio de la comuna. No obstante, la disminución en RLH y Hurto, los demás DMCS muestran incrementos significativos, destacando los RCI y RCV, con 60% y 32% respectivamente, en comparación a igual período del año anterior. Además de los datos oficiales respecto a la actividad delictual, el diagnóstico se fundamenta en información cualitativa sistematizada en la Mesa de Análisis de Seguridad (MAS) semanal que realiza Seguridad, en el ejercicio de actividades en terreno; y en la permanente comunicación con los vecinos.

Problema a intervenir

La principal problemática en materia de seguridad ciudadana en la comuna, está determinada por las deficiencias en materia de conectividad entre los vecinos y vecinas que residen en las localidades y/o sectores más apartados, especialmente en el área de extrema ruralidad; dado a que, según las cifras señaladas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la comuna tiene una población total de 8.837 habitantes, de los cuales el 72,03% de los habitantes corresponde a una población rural y tan solo el 27,97% corresponde a una población urbana. En donde, la comunicación entre los vecinos se dificulta aún más por lo estival del clima, el cual muchas veces es agreste, especialmente durante los meses de invierno, sumado a otras dificultades como la falta de acceso de señal telefónica, incluso en ciertas localidades aún ni cuentan con energía eléctrica, y también se suman los caminos de acceso que no brindan la mejor conectividad, ya que con frecuencia se rompen por acción de las lluvias y por las plantaciones forestales, trayendo como problemáticas la destrucción de puentes y caminos además de enormes cantidades de terreno despoblado apto para que los delincuentes puedan protegerse de la presencia policial. A lo anterior, se le debe sumar el desconocimiento de cifras reales sobre el delito de Abigeato, producto de lo cual, aún no se pueden generar estrategias que permitan contar con un mayor coeficiente de Carabineros, constituyéndose en una problemática que se ha ido incrementando en los últimos años de forma considerable en la comuna, aunque más bien se trata de un problema a nivel país. Y según las estadísticas oficiales la concentración geográfica del delito se produce en la zona centro sur, se registran más del 75% del total de denuncias y detenciones a nivel país. No obstante, en la comuna, la ocurrencia de delitos se hace cada vez más habitual, produciéndose un aumento importante en el último tiempo de los delitos de mayor connotación social, así como los delitos en la propiedad privada, más aún cuando hablamos del delito de Abigeato, ya que este acto delictual se mueve de forma silenciosa en los campos de nuestra comuna, impactando de

manera drástica en la economía de los hogares concentrados en los sectores rurales, dado a que una de las principales actividades económicas se basa en la crianza de ganado como también en la utilización de animales para la realización del trabajo de campesinado, producto de lo cual, no las prácticas de Abigeato no sólo afecta a quienes resultan con el daño material del robo de sus animales, sino también debido a la forma en cómo estos animales faenados son comercializados sin ningún control sanitario, eso sin considerar los procesos de refrigeración y contaminación de este elemento utilizado como insumo alimenticio primordial en la dieta de las personas, traduciéndose en esta problemática en una serie de factores de riesgos para las personas, como lo es la contaminación alimenticia, el incremento delictual del ganado y por ende el impacto económico sobre todo en aquellas familias cuyos ingresos dependen de la actividad laboral entorno a la crianza de animales, más aún en aquellos sectores donde no cuentan con un sistema de conectividad preventivo ante estos actos delictuales.

Justificación

El proyecto es una importante estrategia de generación de espacios y vinculación entre los vecinos de los sectores rurales e instituciones públicas, privadas y policiales. Cuya iniciativa permitirá encargarse de varias problemáticas a partir del delito de Abigeato, específicamente de aquellas que son parte de la seguridad ciudadana rural y de extrema ruralidad, como lo es el déficit de comunicación y conectividad entre los vecinos para evitar la comisión de este delito, dado al mal estado de los caminos, la falta de medios de comunicación para solicitar auxilio a las instituciones de emergencia, como lo son las Postas de Salud Rural, Bomberos y Carabineros, la falta de conocimientos legales para perseguir jurídicamente a los autores de los delitos, carencia de medidas o técnicas para prevenir los actos ilícitos, entre otros factores de esencial importancia. Sin embargo, los aportes que realiza la presente iniciativa en aquellas líneas de intervención comunitaria son el acercamiento de la comunidad rural a las instituciones de orden y seguridad, favoreciendo la integración de los sectores más aislados de la población comunal.; ya que se ha comprobado que el territorio adquiere vida cuando se genera el sentido de pertinencia, donde los habitantes hacen suyo el espacio donde viven y a través de la acción cotidiana generan la acción de vinculación social, cuya estrategia de participación se convierte en la herramienta que siempre tienen las personas no solo para levantar causas ante determinadas circunstancias, sino también permite adelantarse de manera preventiva a los fenómenos y problemáticas que les afecta en momentos determinados. Por lo que, el implementar el proyecto “Unidos, protegidos y comunicados prevenimos los delitos” nace de la evidencia a partir de los robos de Abigeato, pero sustentado por la participación y el interés que tienen los vecinos en dar una pronta solución; en donde, la presente iniciativa responde a una gran necesidad de los vecinos en lo que se refiere a seguridad ciudadana y que es tiempo de abordar para poder cubrir con aquellas necesidades de carácter comunitario. Dado a que, la mayor parte del tiempo y los esfuerzos en este ámbito se enfocan en la zona urbana, como lo es mediante la recuperación de espacios públicos, iluminación, cámaras de televigilancia o alarmas comunitarias, pero en muy pocas ocasiones se enfocan los esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad a los campesinos, quienes de manera frecuente se encuentran tan o más vulnerables a la delincuencia, lo cual se intensifica en mayor medida cuando no se cuenta con sistema de conectividad adecuado, no obstante, al no implementar el respectivo proyecto se seguirá generando brechas de acceso y ausencias de mecanismos preventivos ante todo acto delictual.

Objetivos y Coberturas

Objetivo General	
Contribuir a la disminución de factores de riesgo, percepción de temor e inseguridad mediante la incorporación de nuevas metodologías en prevención situacional y/o tecnologías.	
Objetivos Específicos	
1. Planificar y organizar un trabajo coordinado con los actores locales presentes en el territorio. 2. Llevar a cabo las acciones que permitan la materialización de las intervenciones propuestas en el territorio focalizado. 3. Realizar talleres con los actores locales promoviendo el buen uso y mantención de la intervención.	
Focalización Territorial	
Región	XV Región de Arica y Parinacota
Comuna	Putre
Sector, Población, Barrio, Villa	sectores rurales comuna
Describe el territorio focalizado a intervenir	La comuna, es una comuna de carácter rural, la cual cubre una superficie de 957 Kms.2, ocupando el sector poniente de la Provincia. Este territorio fue fundado el 26 de diciembre de 1926. Su colonización data de principios del siglo XX. En la zona de Alto Río Cisnes, durante 1920, se comenzó a instalar la estancia llamada "Sociedad Ganadera Cisnes". Al disponer de más de 100.000 há. se transforma en la tercera concesión más grande de la región de Aysén. Esta empresa ocupó casi por completo el sector. En 1936 se destinan los terrenos para la instalación del pueblo de la comuna. En 1979 se constituye como comuna. En 1981 se instala la Municipalidad y en 1982 se funda Villa. La comuna es esencialmente rural y las principales actividades desarrolladas por la población se obtienen del sector agropecuario y forestal. Se ubica en la Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. Pertenece a la 18ª Circunscripción Senatorial, Aysén. Tiene una superficie de 5.422,3 km ² y tiene una población de 852 habitantes. El paisaje está formado por bosques siempre verdes, estepa patagónica, glaciares y lagos. La comuna es esencialmente rural, en donde las principales actividades desarrolladas por la población se obtienen del sector agropecuario y forestal. Geográficamente la comuna se caracteriza por estar conformada por dos grandes cuencas, la del río Figueroa y la del río Cisnes, separadas entre sí por numerosos cordones montañosos, que generan dos sectores poblados aislados entre ellos, y el sector de Villa Amengual-Villa La Tapera, que concentran cerca del 65% de la población comunal (toda la información de acuerdo al Censo de 2017). De estas localidades, y la Villa cumplen una función fundamental en la entrega de servicios a los asentamientos rurales.
Población Objetivo	
Nº de Beneficiarios Directos (personas)	3200
Descripción de características de los beneficiarios directos	
Los beneficiarios directos son principalmente habitantes de población adulta y adulta mayor, dedicada al trabajo agropecuario, situada en los asentamientos rurales que rodean a las localidades de la comuna, en la Villa A y Villa B. Estos asentamientos son los sectores de Cacique Blanco, El Poncho, Río Turbio, La Frontera, El Maitenal, La Esperanza, El Figueroa, El Escondido, Las Quemadas, El Caceres, El Caronte, La Zaranda, El Moro, Santa Teresa y Cisne Medio. Los beneficiarios indirectos corresponden a la totalidad de la población de la comuna de Lago Verde, es decir, 852 habitantes según el CENSO 2017. Si bien serán 31 los pobladores que recibirán estos radiotransmisores, el proyecto mejorara la calidad de vida de todos y potenciara a la totalidad de la comuna, permitiendo acercar la estructura de oportunidades y ayudando al correcto desarrollo comunal.	

Cuadro de Infraestructura comprometida

Descripción de la infraestructura comprometida

Sumado a la instalación de los puntos de comunicación radial y las respectivas antenas que serán instaladas en las sedes de cada junta de vecinos beneficiadas, se considera la instalación de una antena repetidora de no menos de 45 metros de altura, producto de lo cual, la entidad municipal postulante se compromete a gestionar el terreno necesario para su instalación. Además de lo anterior, la municipalidad dispondrá de una sala de recepción de comunicación con una persona a cargo, técnico informático u otro a fin, el cual tendrá como función principal el encargarse de la recepción y el correcto funcionamiento de cada equipo, así como la mantención sostenible de los equipos una vez haya expirado la garantía de cada uno de ellos. Cabe destacar, que la central de comunicaciones dispondrá de un horario de 24 horas, es por ello que en las localidades que aún no cuentan con suministro eléctrico, la entidad municipal se compromete a dotar de este vital recurso.

Cuadro Infraestructura comprometida

Tipología	Item	Cantidad
IPSI	N° de elementos instalados	55

Plan de Gestión

En cuanto a las acciones necesarias para el proceso de mantención y/o operación de la intervención propuesta, así como las medidas de gestión necesarias para su implementación, el organismo municipal por intermedio de la DOM considerará diversas estrategias para la adecuada mantención operativa de los equipos adjudicados; por otro lado, en caso de que las JJ.VV no cuenten con el suministro eléctrico para el correcto uso y funcionamiento de las radios teleoperadoras digitales, será quién proporcione los respectivos recursos; sin embargo, antes de hacer la entrega definitiva de los equipos, se entregará una serie de capacitaciones técnicas para el correcto uso de los aparatos y de esta forma prevenir posibles daños. Por otro lado, y en lo referido a los comités de vigilancia rural, se contará durante y después de la ejecución del proyecto con la asesorías de carabineros, con la finalidad que la respectiva entidad los capacite de forma permanente ante sus derechos.

Metología y Actividades

Descripción Metodológica

La metodología a utilizar en el presente proyecto es de carácter participativa, centrada principalmente en generar los nexos de apoyos necesarios para que entre los vecinos para que ellos de manera articulada y coordinada puedan protegerse de forma mutua, en donde también se integraran los respectivos organismos que les puedan brindar el apoyo necesario en materia de prevención y protección de seguridad ciudadana, como lo es la entidad municipal y Carabineros de Chile. Producto de lo cual, no tan solo se fortalecerá la unidad vecinos y las respectivas entidades públicas relacionadas con el área de seguridad pública, sino se organizaran comités de vigilancia rural. No obstante, la ejecución del proyecto incorpora la elaboración de un diagnóstico socio delictual participativo, donde las fuentes primarias de información será la comunidad a través de las J.J.VV en conjunto con las distintas instituciones y coordinación de redes, lo cual permitirá develar y cuantificar el fenómeno de Abigeato en la comuna. En donde y sumado a lo anterior, se procederá a realizar talleres de capacitación a la comunidad relativos a la prevención comunitaria de del delito unión, sumado a la unión y fortalecimiento vecinal para los respectivos procesos de denuncia y seguimiento procesal con las instituciones colaboradoras, como lo es Fiscalía, Carabineros, SAG, PDI. A partir de todo lo anterior se dejará instalado un sistema de comunicación y centro de operaciones que permita a la comunidad estar conectados a través de la participación activa de la comunidad con énfasis en la prevención delictual del delito de Abigeato.

Equipo Ejecutor

Cargo	Perfil	Funciones Asociadas	Carga Horaria	Tipo Aporte	Remuneración	Meses de contrato
Contraparte Técnica y Administrativa	Área de las Ciencias Sociales, área de la Construcción, Administración y/o a fin.	Velar por el cumplimiento del proyecto en los ámbitos técnicos, administrativos y financieros, como así también coordinar las redes de apoyo institucional, municipal y de los vecinos.	0	Aporte Propio	\$ 0	0
Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Área de la Construcción y/o afín	Apoyar la implementación y cumplimiento del ámbito técnico y administrativo de la ejecución de las obras y/o prestación de servicios.	22	Aporte Propio	\$ 0	0
Profesional de apoyo para ámbito comunitario	Área de las Ciencias Sociales y/o afín	Apoyar la implementación y cumplimiento del ámbito comunitario y participativo del proyecto.	22	Aporte Propio	\$ 0	0

Líneas de Intervención, etapas y actividades

Línea de Intervención	Etapas	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Inicio	Término
Inicial	Instalación	Instalación	Realización de trámites previos al inicio de la intervención como recepción de fondos, presentación de acta de inicio, validación y contratación del equipo ejecutor, entre otras.	Entidad Ejecutora	Mes 1	Mes 1
Intermedia	Inserción Comunitaria	Comienzo y/o lanzamiento con la comunidad	En la Sede Vecinal, conjunto a autoridades presentes y comunidad beneficiada se realiza ceremonia de inicio de proyecto, en la actividad se explica en resumen	Contraparte Técnica y Administrativa	Mes 2	Mes 3


			en qué consistirá el proyecto y se le da la oportunidad a las autoridades		
Intermedia	Inserción Comunitaria	Diseño y validación de material de difusión	Se envía validación de diseños de dependón roller, lienzo, tazones para reuniones, insumos para comité de seguridad barrial.	Contraparte Técnica y Administrativa	Mes 2 Mes 4
Intermedia	Inserción Comunitaria	Reunión(es): Coordinación de redes	Realizar reuniones de carácter mensual con las JJ.VV en conjunto con las redes comunitarias, según cartas de compromiso adjuntas.	Profesional de apoyo para ámbito comunitario	Mes 3 Mes 9
Intermedia	Inserción Comunitaria	Reunión(es): Informativa del estado de ejecución	Una vez al mes se realizarán reuniones informativas del avance del proyecto, donde participará la directiva de la junta de vecinos y la contratarte técnica además del profesional de apoyo contratado por el proyecto.	Contraparte Técnica y Administrativa	Mes 2 Mes 9
Intermedia	Inserción Comunitaria	Capacitación(es): Uso, operación y/o mantención	Le corresponderá a la empresa realizar capacitaciones del uso operación y mantención del sistema, junto con entregar una copia de las especificaciones técnicas del sistema. Será supervisada por la contratarte técnica dicha acción.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 7 Mes 9
Intermedia	Inserción Comunitaria	Capacitación(es): Comité de seguridad y plan de acción comunitario	Elegir en cada JJ.VV un directorio que vele por resguardada la seguridad pública en su localidad, producto de lo cual, aquellos que conformen este comité serán capacitados por carabineros y otras entidades públicas relativas a la materia de seguridad ciudadana.	Profesional de apoyo para ámbito comunitario	Mes 3 Mes 7
Intermedia	Ejecución de Obras	Ajustes del Proyecto Técnico	Se revisará junto a al departamento municipal técnico encargado de realizar el proceso de licitación los ajustes técnicos en caso de ser necesario, según el	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 2 Mes 3

			escenario real al momento de iniciar su ejecución.		
Intermedia	Ejecución de Obras	Elaboración de bases	Profesional técnico iniciara el proceso de redacción de bases de licitación, según proyecto técnico presentado al concurso.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 3 Mes 3
Intermedia	Ejecución de Obras	Publicación de bases	Departamento técnico encargado de publicaciones licitaciones municipales iniciara el proceso de licitación en plataforma de mercado público.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 3 Mes 4
Intermedia	Ejecución de Obras	Adjudicación	Departamento técnico encargado de evaluar el cierre de licitación iniciara el proceso adjudicatorio. En caso de presentar oferentes se espera realizar nueva licitación.	Profesional de apoyo para el ámbito comunitario	Mes 4 Mes 5
Intermedia	Ejecución de Obras	Firma de contrato	Departamento técnico encargado de realizar la contratación de la empresa adjudicada, procederá a finalizar tramites administrativos y técnicos con la empresa seleccionada para implementar el proyecto.	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 5 Mes 5
Intermedia	Ejecución de Obras	Entrega de terreno	Profesional técnico municipal en conjunto con representante de la empresa inician formalmente el acto de entrega de terreno a la empresa para su ejecución. Se indica el plazo para instalación de letreo de obras,	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 5 Mes 6
Intermedia	Ejecución de Obras	Ejecución de la obra	Proceso de ejecución de las obras físicas, las cuales serán supervisadas por profesional del departamento de Obras municipales encargado (ITO).	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 6 Mes 7
Intermedia	Ejecución de Obras	Recepción Provisoria de la obra	Finalizado la correcta construcción de las obras, se procede a realizar el acto de	Profesional de apoyo para el ámbito técnico	Mes 7 Mes 8

			recepción provisoria del proyecto, considerando las fechas estipuladas en el contrato.			
Final	Cierre de proyecto	Inauguración del proyecto	Se realizará una actividad de inauguración del espacio público, junto con la comunidad y los organismos que participaron en la realización y mejoramiento.	Contraparte de Técnica y Administrativa	Mes 9	Mes 9

Carta Gantt y Ejecución del proyecto

Ejecución proyecto: 9 meses

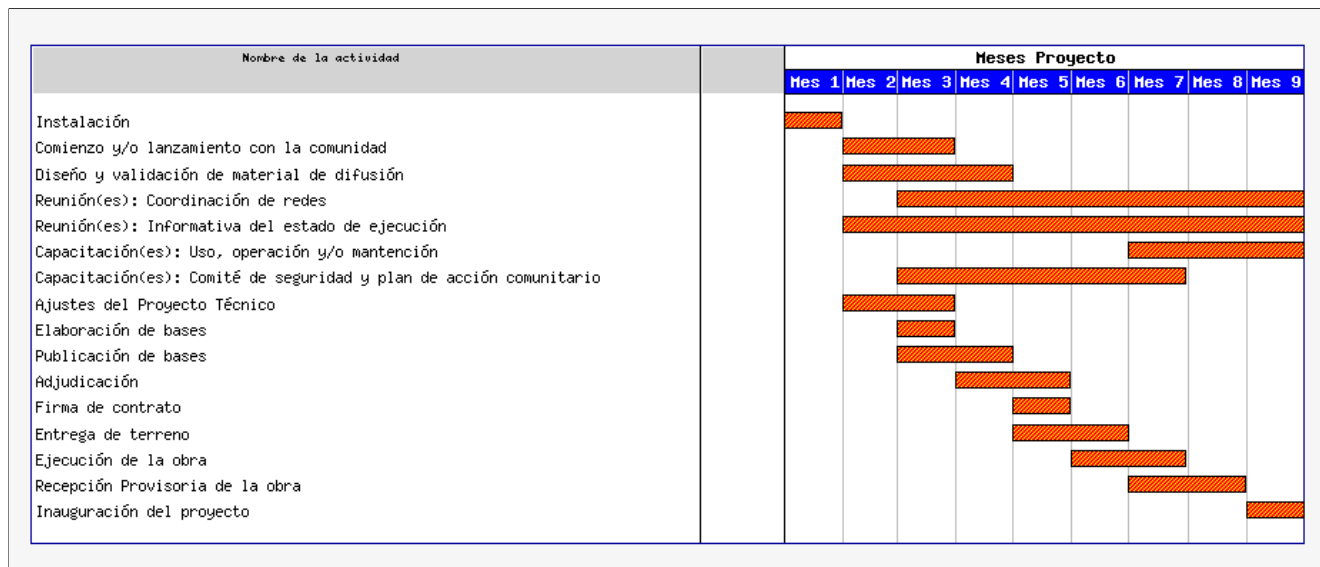

Coordinación en redes

Institución	Ámbitos de coordinación	Contacto responsable
Unión Comunal de Juntas de Vecinos	Coordinación con cada una de las JJ.VV beneficiadas en el ámbito de implementación y capacitación	Presidenta Unión Comunal
Oficina de Protección de Derechos	Se coordinara con OPD a fin de capacitar en materia de prevención delictual a Niños, niñas y adolescentes	Directora OPD
Tenencia de Carabineros	Coordinar ámbitos de acción en materia de prevención delictual y solicitudes de la comunidad ante el delito.	Tenencia de Carabineros

Resultados Esperados

Resultado Esperado	Indicador	Meta	Verificador
Plan de trabajo de proyectos, tipologías de prevención situacional	Plan de trabajo de proyectos de prevención situacional	100 %	-Plan de trabajo de proyectos de prevención situacional y cronograma asociado -Registros de asistencia -Registro
Aumento de la percepción de seguridad de la población beneficiaria del proyecto	Porcentaje de vecinos que aumenta la sensación de seguridad en el territorio cubierto por el proyecto	50 %	-Encuesta de percepción de inseguridad
El proyecto provee prestaciones de calidad	Porcentaje de beneficiarios/as que evalúan positivamente el proyecto	50 %	-Encuestas de satisfacción de usuarios/as -Informe de calidad del proyecto

Presupuesto

Itemizado Presupuestario

Ítem Presupuestario	Descripción	Aporte Solicitado	Aporte Propio	Aporte Terceros
Sistemas tecnológicos y gastos asociados	Adquisición e instalación de sistema de radio de comunicación rural, según presupuesto itemizado presentado.	\$ 37.500.000	\$ 0	\$ 0
Difusión y Publicidad	Pendones, pasacalles, folletería según cotización.	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0
Servicios de producción y desarrollo de eventos	Ceremonia de cierre de proyecto; servicios de banquetería y/o coffee break (adjunta cotización)	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0

Resumen Presupuestario

Ítem Presupuestario	% FNSP	Aporte Solicitado	Aporte Propio	Aporte Terceros	Total
Sistemas tecnológicos y gastos asociados	97 %	37.500.000	0	0	37.500.000
Difusión y Publicidad	2 %	700.000	0	0	700.000
Servicios de producción y desarrollo de eventos	1 %	500.000	0	0	500.000
Total	100 %	\$ 38.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.700.000

Justificación presupuestaria






1. ítem infraestructura corresponde a Proyecto técnico según itemizado presupuesto elaborado por el municipio. 2. ítem Difusión y publicidad; corresponde a insumos para llevar a cabo la actividad de difusión presentada en el cronograma de actividades del proyecto. Se adjunta cotización respaldando el valor de los elementos presentados 3. ítem servicios de producción y eventos; corresponde al acto de cierre del proyecto, vinculado a la actividad de cierre presentado en cronograma de actividades, se adjunta cotización de banquetearía del servicio para el acto.









Resumen

Resumen descriptivo del proyecto

El proyecto se centra en poder disminuir los delitos de Abigeato en la comuna, el cual consiste en implementar un sistema de comunicación mediante un sistema de radio teleoperadoras digitales con la finalidad de que las juntas de vecinos puedan alertar oportunamente a los Carabineros, maximizando de esta manera los esfuerzos de la institución ante el extenso territorio de la comuna, el cual se caracteriza por poseer niveles de extrema ruralidad cuyo porcentaje es considerablemente mayor a los datos estadísticos de la Región, sumado a su clima hostil y de difícil acceso, en donde la comunicación celular es deficiente. Sumado a ello, la iniciativa contempla un trabajo comunitario con los vecinos beneficiados a través de la conformación de un gran sistema de coordinación vecinal basado en la creación de comités de seguridad vecinal y vigilancia rural, cuyo ultimo fin es aumentar la cohesión comunitaria como red de protección ante la delincuencia y la interconexión con los organismos públicos pertinentes. Lo cual, sin duda también impactará de manera positiva en la prevención de otras problemáticas que genera el delito de Abigeato, como lo es la faena ilegal de animales y la contaminación alimenticia a partir producto de la venta clandestina de carne.

Anexos

Anexos del Proyecto	
Declaración jurada de no estar sujeta a Inhabilidades (NOTARIAL)	
Declaración jurada de "Aportes Propios" (Cuando corresponda)	
Declaración jurada de "Aportes de Terceros" (Cuando corresponda)	
Carta Compromiso Municipal	
Otros anexos de admisibilidad según tipo de proyecto	

Anexos requeridos		
Documento	Formato Archivo	Tipología IPSI
Certificados y Cartas de compromiso		
1-Plano de ubicación y emplazamiento del área a intervenir	AUTOCAD	
2-Plano de Situación Existente: planta, simbología, cortes, perfiles de calles, entre otros.	AUTOCAD	
3-Plano de Situación Propuesta: planta, simbología, cortes, perfiles de calles, entre otros.	AUTOCAD	
4-Planos firmados o viñetas firmadas	PDF	
5-Especificaciones Técnicas	PDF	
6-Presupuesto itemizado	PDF	
Proyecto Técnico		
1-Carta Compromiso de Mantención	PDF	
2-Plan de Mantención	PDF	

Otros Anexos	
l.jpg	
